




Inbetriebnahmeanleitung HomeBloC® Digital WR / WF / WRF / WRF-E Vollelektronisch

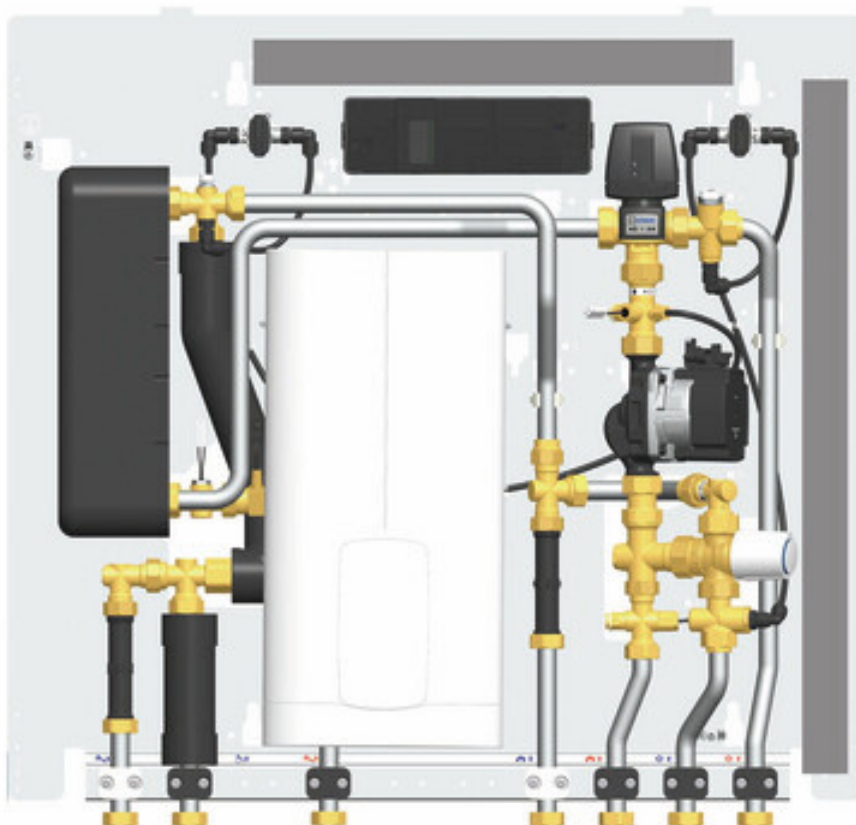

Hinweis

Diese Anleitung dient nur der Übersicht. Sie ist eine Ergänzung und ersetzt **nicht** die Montage- und Bedienungsanleitung!


Die in der Hauptanleitung beschriebenen Hinweise und Warnungen sind zwingend zu beachten!




Schritte, die mit  gekennzeichnet sind, müssen in der jeweiligen separaten Anleitung nachgelesen werden.

1 Elektro-Installation

1. Montage



2. Klemmen O3 und O4 (Typen WF, WRF-E und WRF+DLE+Fußbodenverteiler)



3. Zone 1 - 5 (Fußbodenverteiler)




4. Raumbedieneinheit (RBE) (alle HomeBloC® Digital)




2 Inbetriebnahme


1. Spülen und Befüllen

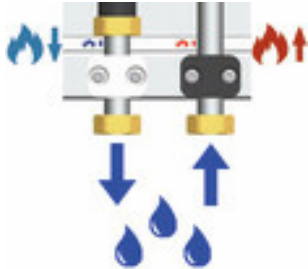


<- spülen
befüllen ->

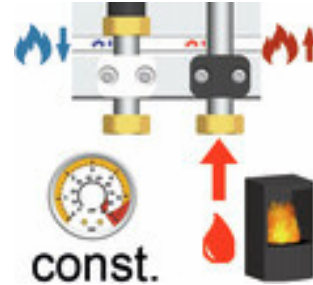


2. Kugelhähne prüfen




3. Spannungsversorgung herstellen

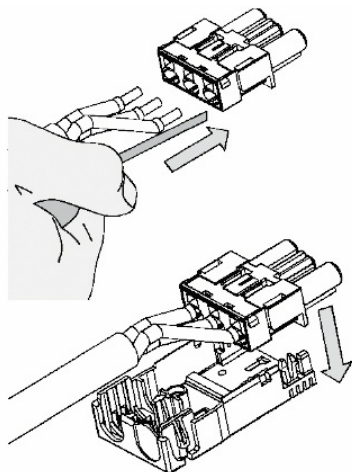


Montage der Zugentlastung

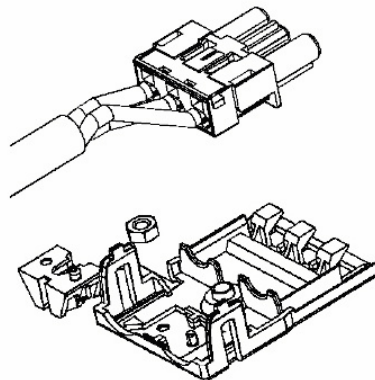

Quelle: Wieland




Steckverbinder umdrehen




Quelle: Wieland


Fertig!




Quelle: Wieland



230 V




4. Kopplung

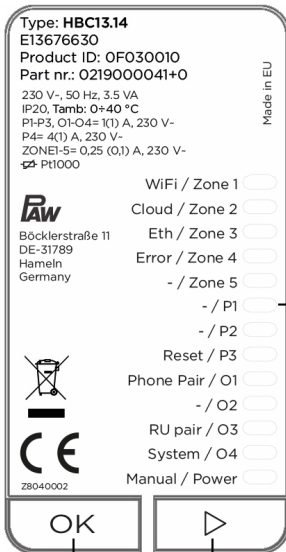


- LED leuchtet: Zeigt Menü / mit RBE verbundene Zone an
- LED blinkt (langes Intervall): Pairing Mode Zone mit RBE
- LED ist aus

LEDs zur
Signalisierung
des Betriebs

Bestätigungs-Taste
Auswahl-Taste ("weiter")

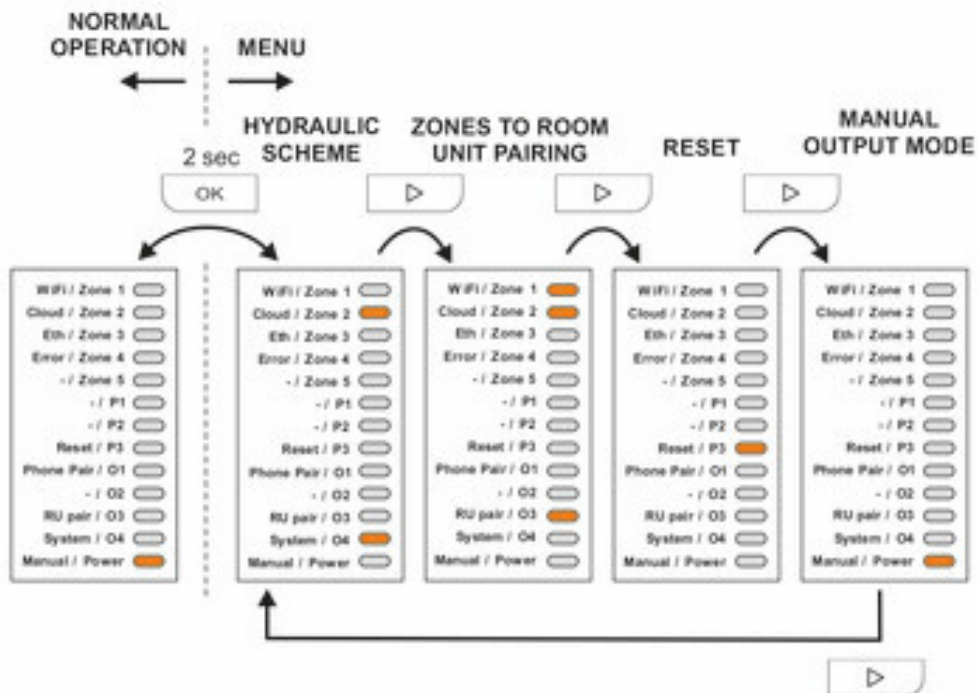

2 Inbetriebnahme

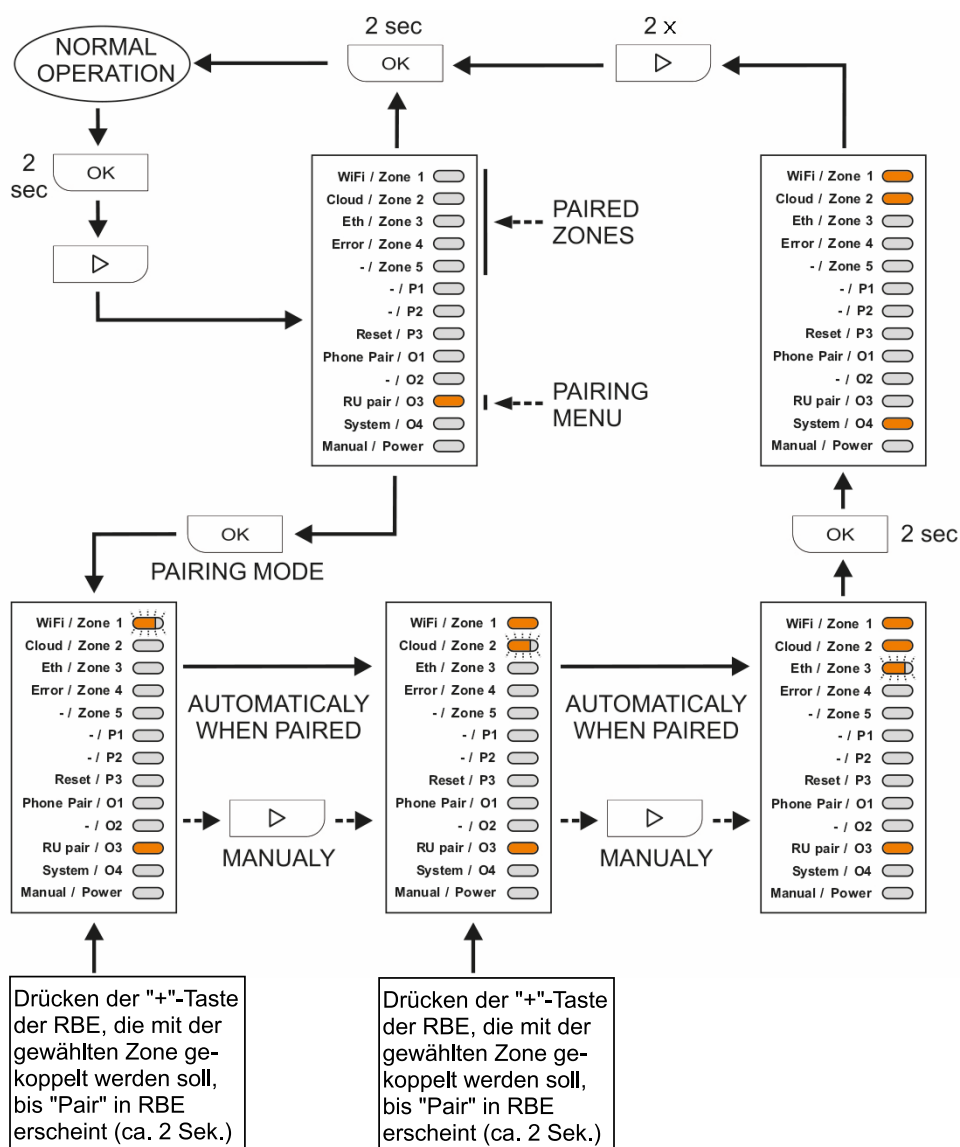

5. Start Betrieb



Voreingestellte Werte:

Station (Typ)	WR	WF	WRF	WRF-E
Trinkwarmwasser-Temperatur	45 °C			
Differenzdruck Radiatorkreis	50 mbar		50 mbar	50 mbar
Differenzdruck Fußbodenkreis		150 mbar		150 mbar



Hauptanleitung HomeBloC® Digital



PC-Software HomeBloC® Digital
<https://tinyurl.com/PAW-HomeBloC-Digital>



Anleitung Regler



Anleitung RBE

3 Abnahme- / Inbetriebnahmeprotokoll

3 Abnahme- / Inbetriebnahmeprotokoll

Kunde:		Adresse, Telefon, E-Mail:	
Fachhandwerksbetrieb:		Adresse, Telefon, E-Mail:	
Inbetriebnahme durch:			
Objekt:		Wohnfläche: m ²	Heizbedarf: kW
Wohnungsstation-Typ:		Artikelnummer:	
		Seriennummer:	
Inbetriebnahmearbeiten		erledigt	
Prüfungen vor Inbetriebnahme		☐	
Spülen		☐	
Befüllen		☐	
Entlüften		☐	
Einstellwerte überprüfen		☐	
Heizkreise:	☐ Heizkörper ☐ Fußboden		
Werte:	Warmwassertemperatur: °C		
	Vorlauf-Temp.: °C	Rücklauf-Temp.: °C	Heizkörper-Kreis
	Vorlauf-Temp.: °C	Rücklauf-Temp.: °C	Fußboden-Kreis
	Einstellwert Sicherheits-Temperatur-Begrenzer: °C		
	Einstellwert Differenzdruck:	Heizkörperkreis: mbar	Fußbodenkreis: mbar
Bemerkungen / Vereinbarungen:			
Die Inbetriebnahme wurde ordnungsgemäß durchgeführt.			
Datum	Unterschrift Kunde	Unterschrift Fachhandwerker	

Art.Nr. 9912xxxx10x-qug-de

Original-Anleitung

Technische Änderungen vorbehalten!

Printed in Germany – Copyright by PAW GmbH & Co. KG

PAW GmbH & Co. KG

Böcklerstraße 11

31789 Hameln, Germany

www.paw.eu

Tel: +49-5151-9856-0

Fax: +49-5151-9856-98
